Activity ID	Activity Description	Orig Dur	Early Start	Early Finish
010	Mobilize to Job Site	10	23AUG11A	06SEP11
020	Temporary Construction Access	5	30AUG11	06SEP11
030	Pile Driving	6	07SEP11	14SEP11
040	Bridge Construction	1	15SEP11	15SEP11
050	Phase II Excavation & Rip Rap	5	16SEP11	22SEP11
060	Install Pier Bracing	4	21SEP11	26SEP11
070	Install Rip Rap	2	27SEP11	28SEP11
090	Demobilization	10	28SEP11	11OCT11
080	Site Restoration	5	29SEP11	05OCT11

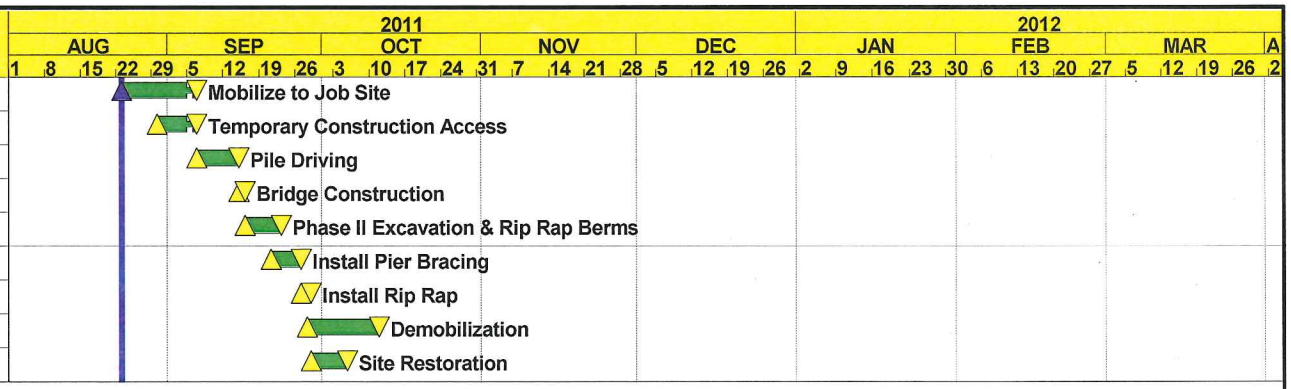

Start Date	01AUG11
Finish Date	11OCT11
Data Date	23AUG11
Run Date	25AUG11 09:33

Early Bar
Progress Bar
Critical Activity

© Primavera Systems, Inc.

4881

Sheet 1 of 1

Dondlinger & Sons Const. Co., Inc.

UPRR Service Order 48790

Classic Schedule Layout

Date	Revision	Checked	Approved
25AUG11	Up-dated Project Schedule		
